

Ongeval met verzuim Factsheet 6

36

Ongevalvrije
dagen tot ongeval



SRNL Projecten

M

45802



Meer info?

Dit vind je in de
aankomende
veiligheidsmemo



Werkzaamheden bestonden uit:

Na het inschuiven van een viaduct vonden er terugbouwwerkzaamheden aan het spoor plaats. Er werden secties van 6 meter gelegd die gekoppeld moesten worden en daarna ontkoppeld om de definitieve spoorstaaf te plaatsen. Tijdens het ontkoppelen schoot de noodlasplaat weg en kwam tegen de voet aan.

Locatie:

Groningen



Baanvak:

Emplacement Groningen –
Groningen Noord

Vergelijkbare incidenten

- Januari 2020
Balk schiet weg, raak een trap die een medewerker treft in het gezicht
- April 2021
Krik bleef haken en schiet los tegen borst medewerker.



Arborisico:

Wegschietende
voorwerpen




Slachtoffer heeft:

Kwetsuren rechter voet


Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2023

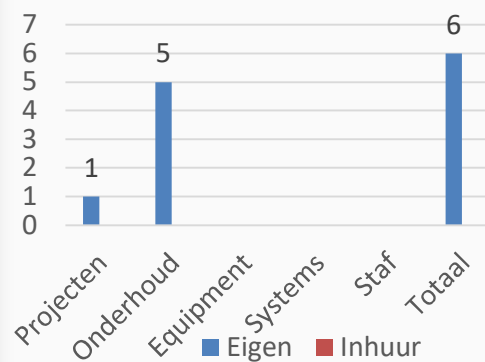


Ongeveldatum

Woensdag 03 mei 2023 - 03:00 uur



Omstandigheden tijdens het incident:



Veilig en gezond uit en thuis



StocoNL

088 321 17 00

En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?
