

Ongeval met verzuim

Factsheet 2

56

Ongevalvrije
dagen tot ongeval



SRNL Projecten
Catenairy Europe



Meldingsnummer
4313




Meer info?
Dit vind je in de
aankomende
veiligheidsmemo



Werkzaamheden bestonden uit: Het uitwisselen van bovenleidingportalen. De portalen werden platgelegd en met een voorhamer werd het beton kapot geslagen. Bij het doorslaan van het laatste stukje beton, valt de gehele mast 40cm naar beneden. Hierbij kwam de voet van onze collega bekneld te zitten.

Locatie:
Loon, Assen

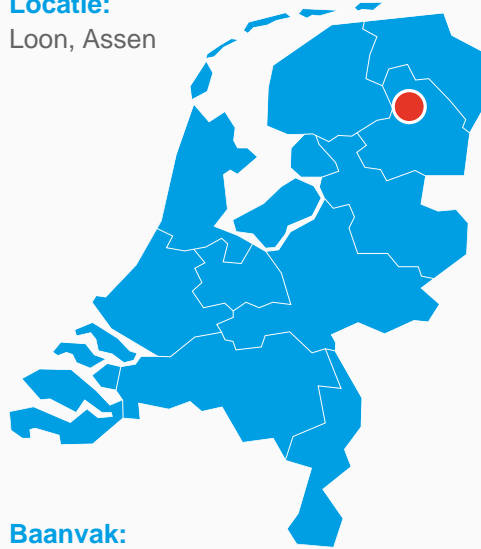


Baanvak:
011 Assen - Haren

Vergelijkbare incidenten



- Jan 2020
Voet bekneld tussen spoorstaaf en Knijperbak
- Nov 2018
Vinger bekneld bij verplaatsen haspel
- Dec 2016
Been bekneld tussen 2 voertuigen
- Mei 2016
Pink bekneld onder schiftijzer




Arborisico:
Knellen en pletten



Slachtoffer heeft:
Fors gekneusde rechter voet

Aantal ongevallen met verzuim SRNL 2020

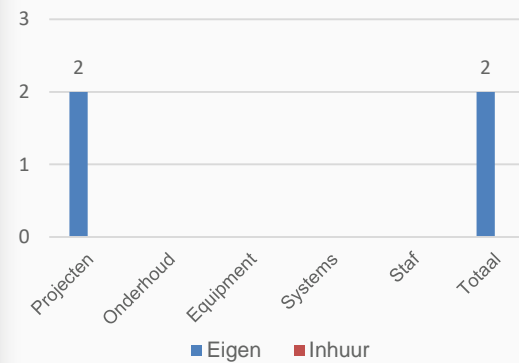


Ongevalsdatum

Zondag 12 januari 2020 - 04:15 uur



**Omstandigheden
tijdens het incident:**



**Veilig en gezond
uit en thuis**

 **StocoNL**
030 240 76 99
En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?
